
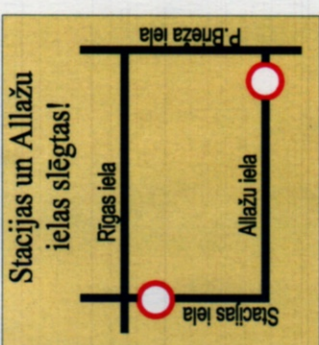
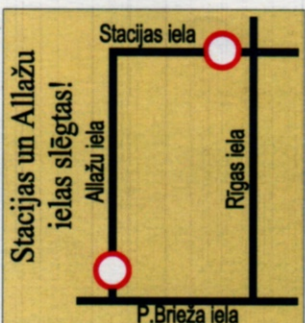


Būvdarbu vietas lokālais aprīkojums, veicot darbus uz brauktuves.

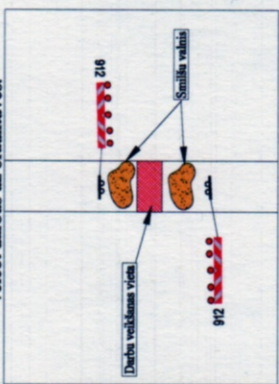

SASKAŅOTS

Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz to izvietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS 77.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Rīgas nodaļas ceļu būvzinieris
M. SIDOROVICHS

05.06.2019

OBJEKTS	Vienlaides asfaltbetona bedrēšu remontdarbi sabrukšos ielu posmos ar asfaltbetona segumu Allažu ielā un Stacijas ielā (No Rīgas ielas līdz Allažu ielai) Siguldā Siguldas novadā.
BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS	<i>07.06.2019 - 06.07.2019</i>
BŪVUZŅĒMĒJS	SIA "GP Holdings" reģ. Nr. 40103638943 Vaidavas iela 8, Saulkrasti, LV-2160
ATBILDĪGAIS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU	Vilnis Paiders, t. 26600554
RASEJUMS	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā, veicot būvdarbus Stacijas un Allažu ielās, Siguldā. Shēma Nr. 1
IZSTRĀDĀJA	SIA "Baltic Trailer Service"

Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.i. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
Aprīkojumu izvieto atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
Nodrošināt piebrauktāšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izveļējiem.
Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvniecības norobežot ar signāllentām un palīgbarjērām.
Esotais ceļa zīmes nav paredzēts demontēt/izņemt.
Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksež būvdarbu žurnālā.
Ceļa zīmes Nr. 118+814816 + 302+814816 uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.
Ceļa zīmi Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma.
Vajadzības gadījumā piesaistīt satiksmes regulētājus.
